赤峰诚鑫矿业有限责任公司梧桐花铅锌矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图

比例尺 1: 5000

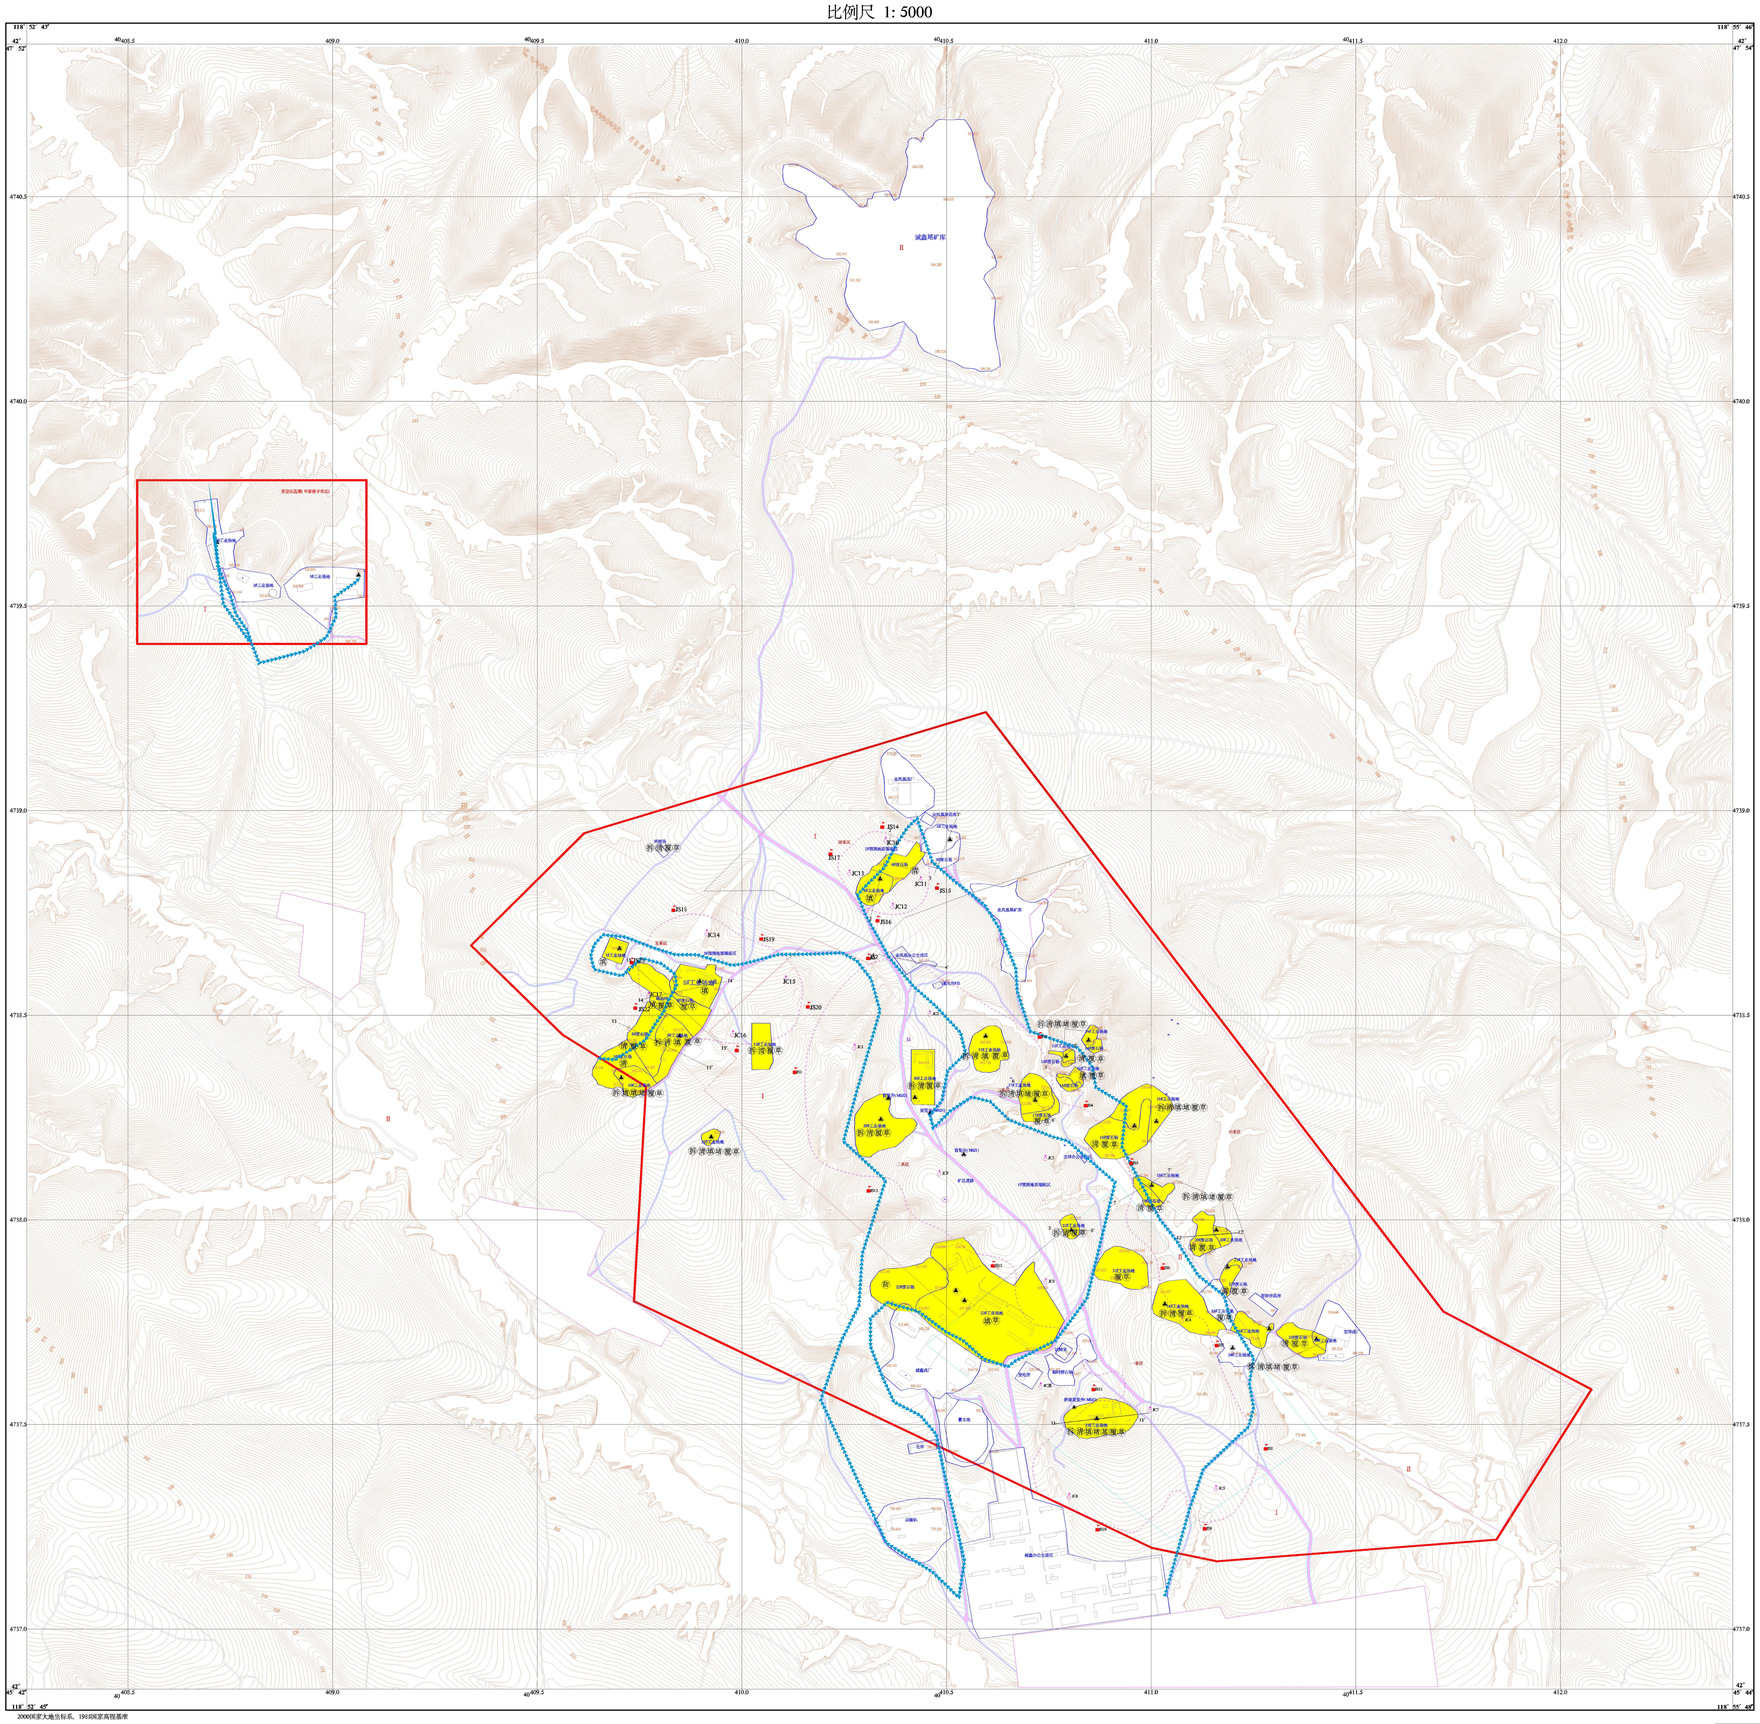

图例

一、矿山地质环境保护与恢复治理分区

2026年度治理区

二、治理与复垦措施

拆	拆除
填	回填、垫坡
覆	覆土
整	石方整平
剥	表土剥离
清	清运
堵	封堵
基	清理地基
草	种草
防	防尘网
灌	灌木
乔	乔木
JC1	监测点
JS1	警示牌
▸▸▸▸	监测路线

三、界线及其它

坚井	坚井位置
通风井口	风井位置
盲竖井MS1	盲竖井位置
已建场地界限	已建场地界限
	矿区道路
A A'	剖面线位置及编号
采区	采区范围及编号
	矿区范围及拐点编号
	预测地面塌陷区

矿山复垦工程量汇总表

序号	单项名称	单位	工程量
一	工程措施		
1	回填/转运	100m³	1517.77
2	垫坡整形	100m²	113.59
3	封堵	眼	11
4	拆除地基清理	100m³	54.17
5	防尘网	100m²	40.5
6	覆土	100m³	611.33
7	撒播草籽	hm²	17.6494
二	监测管护工程		
2	复垦效果监测	土地损毁监测	次 4
		土壤质量监测	次 4
		植被生长状况监测	次 4
3	植被管护	次	4

地质灾害监测点坐标表

工程场地	编号	X	Y	编号	X	Y
1#预测地面塌陷区	JS1	4738364.546	40410129.06	JS8	4737444.4	40411279.39
	JS2	4738642.927	40410308.12	JS9	4737249.119	40411130.46
	JS3	4738450.341	40410727.42	JS10	4737246.34	40410865.31
	JS4	4738283.035	40410839.89	JS11	4737559.267	40410835.64
	JS5	4738142.307	40410950.5	JS12	4737891.509	40410612.88
	JS6	4737835.955	40411027.72	JS13	4738074.67	40410309.42
	JS7	4737696.19	40411129.78			
2#预测地面塌陷区	JS14	4738963.962	40410342.89	JS16	4738734.84	40410331.21
	JS15	4738814.675	40410476.6	JS17	4738897.757	40410216.32
3#预测地面塌陷区	JS18	4738760.566	40409832.63	JS21	4738417.905	40409987.11
	JS19	4738690.257	40410047.26	JS22	4738321.518	40409739.38
	JS20	4738524.478	40410161.23	JS23	4738632.531	40409730.5

2026年度治理工程量一览表

治理时限（年）	治理工程场地	治理工程量	单位	工程量
2025.7.1-2026.6.30	5#废石场	清运	m³	5844
	6#工业场地	垫坡整形	m²	680
	6#废石场	清运	m³	27750
	7#工业场地	垫坡整形	m²	576
	8#工业场地	垫坡整形	m²	552
	8#废石场	覆土	m³	343
		撒播草籽	m²	1143
	9#工业场地	拆除	m³	156
		清运	m³	156
		垫坡整形	m²	486
		覆土	m³	2211
		撒播草籽	m²	7370
	9#废石场	清运	m³	12728
		覆土	m³	2900
		撒播草籽	m²	9663
	10#工业场地	拆除	m³	156
		清运	m³	156
		垫坡整形	m²	486
		覆土	m³	2211
		撒播草籽	m²	7370
	10#废石场	清运	m³	15323
	12#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	563
		覆土	m³	1647
		撒播草籽	m²	5492
	13#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	3
		垫坡整形	m²	396
		覆土	m³	159
		撒播草籽	m²	533
	14#工业场地	拆除	m³	18
		清运	m³	18
		垫坡整形	m²	705
		回填	m³	372
		封堵	眼	1
		覆土	m³	399
		撒播草籽	m²	1329
	14#废石场	清运	m³	460
		覆土	m³	2900
		撒播草籽	m²	920
	15#工业场地	拆除	m³	31
		清运	m³	31
		垫坡整形	m²	97
		回填	m³	458
		封堵	眼	1
		覆土	m³	245
		撒播草籽	m²	817
	15#废石场	清运	m³	190
		覆土	m³	210
		撒播草籽	m²	700
	16#工业场地	垫坡整形	m²	672
		覆土	m³	377
		撒播草籽	m²	1255
	16#废石场	清运	m³	1050
		覆土	m³	210
		撒播草籽	m²	1351
	17#工业场地	拆除	m³	180
		清运	m³	180
		垫坡整形	m²	707
		回填	m³	462
		封堵	眼	1
		覆土	m³	1969
		撒播草籽	m²	6564
	17#废石场	覆土	m³	684
		撒播草籽	m²	2281
	18#工业场地	拆除	m³	254
		清运	m³	254
		垫坡整形	m²	516
		回填	m³	1597
		封堵	眼	1
		覆土	m³	2753
		撒播草籽	m²	9177
	18#废石场	清运	m³	12450
		覆土	m³	3745
		撒播草籽	m²	12485
	19#工业场地	拆除	m³	54
		清运	m³	54
		垫坡整形	m²	289
		回填	m³	343
		封堵	眼	1
		覆土	m³	677
		撒播草籽	m²	2258
	19#废石场	清运	m³	909
		覆土	m³	707
		撒播草籽	m²	2357
	20#工业场地	拆除	m³	74
		清运	m³	74
		垫坡整形	m²	421
		回填	m³	462
		封堵	眼	1
		覆土	m³	677
		撒播草籽	m²	1586
2025.7.1-2026.6.30	20#废石场	清运	m³	12205
		覆土	m³	1753
		撒播草籽	m²	4367
	21#工业场地	拆除	m³	22
		清运	m³	22
		垫坡整形	m²	156
		回填	m³	388
		封堵	眼	1
		覆土	m³	183
		撒播草籽	m²	610
	21#废石场	清运	m³	162
		覆土	m³	607
		撒播草籽	m²	2023
	22#工业场地	拆除	m³	39
		清运	m³	39
		绿化草地	m²	6459
		覆土	m³	3261
		撒播草籽	m²	10870
	22#废石场	防尘网	m²	4050
	23#工业场地	拆除	m³	325
		清运	m³	325
		垫坡整形	m²	546
		回填	m³	1535
		封堵	眼	1
		清基工程	m²	3931
		覆土	m³	183
		撒播草籽	m²	610
	25#工业场地	拆除	m³	24
		清运	m³	24
		回填	m³	453
		封堵	眼	1
		覆土	m³	330
		撒播草籽	m²	1100
	25#废石场	清运	m³	2029
		覆土	m³	1674
		撒播草籽	m²	5580
	28#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	3
		回填	m³	299
		封堵	眼	1
		覆土	m³	388
		撒播草籽	m²	1294
	29#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	3
		覆土	m³	2
		撒播草籽	m²	14493
	30#工业场地	拆除	m³	189
		清运	m³	189
		覆土	m³	141
		撒播草籽	m²	471
	32#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	3
		覆土	m³	2
		撒播草籽	m²	2120
	33#工业场地	覆土	m³	3206
		撒播草籽	m²	9433
	34#工业场地	拆除	m³	3
		清运	m³	3
		覆土	m³	4305
		撒播草籽	m²	14349
	35#工业场地	覆土	m³	1779
		撒播草籽	m²	5930
	36#工业场地	拆除	m³	2
		清运	m³	302
		垫坡整形	m²	224
		回填	m³	245
		封堵	眼	1
		覆土	m³	1282
		撒播草籽	m²	4274
	塌陷坑	回填	m³	43796
		覆土	m³	3766
		撒播草籽	m²	12554
	临时排石场	回填	m³	6646
		覆土	m³	1917
		撒播草籽	m²	6329
	土地损毁监测		次	2
	土壤质量监测		次	2
	复垦植被监测		次	2
	植被管护		次	2
2026.7.1-2027.6.30	土地损毁监测		次	2
	土壤质量监测		次	2
	复垦植被监测		次	2
	植被管护		次	2























内蒙古诚岳地质勘查有限公司 赤峰诚鑫矿业有限责任公司梧桐花铅锌矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图			
拟 编	王 鑫	顺序号	1
审 核	李春善	图 号	1
制 图	李佳琪	比例尺	1: 5000
项目负责人	李春善	日 期	2026.5
法定代表人	闫坤滇	资料来源	实 测
