赤峰盛京矿业有限公司翁牛特旗梧桐花镇敖包吐矿区铜铁矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图

比例尺1:2000

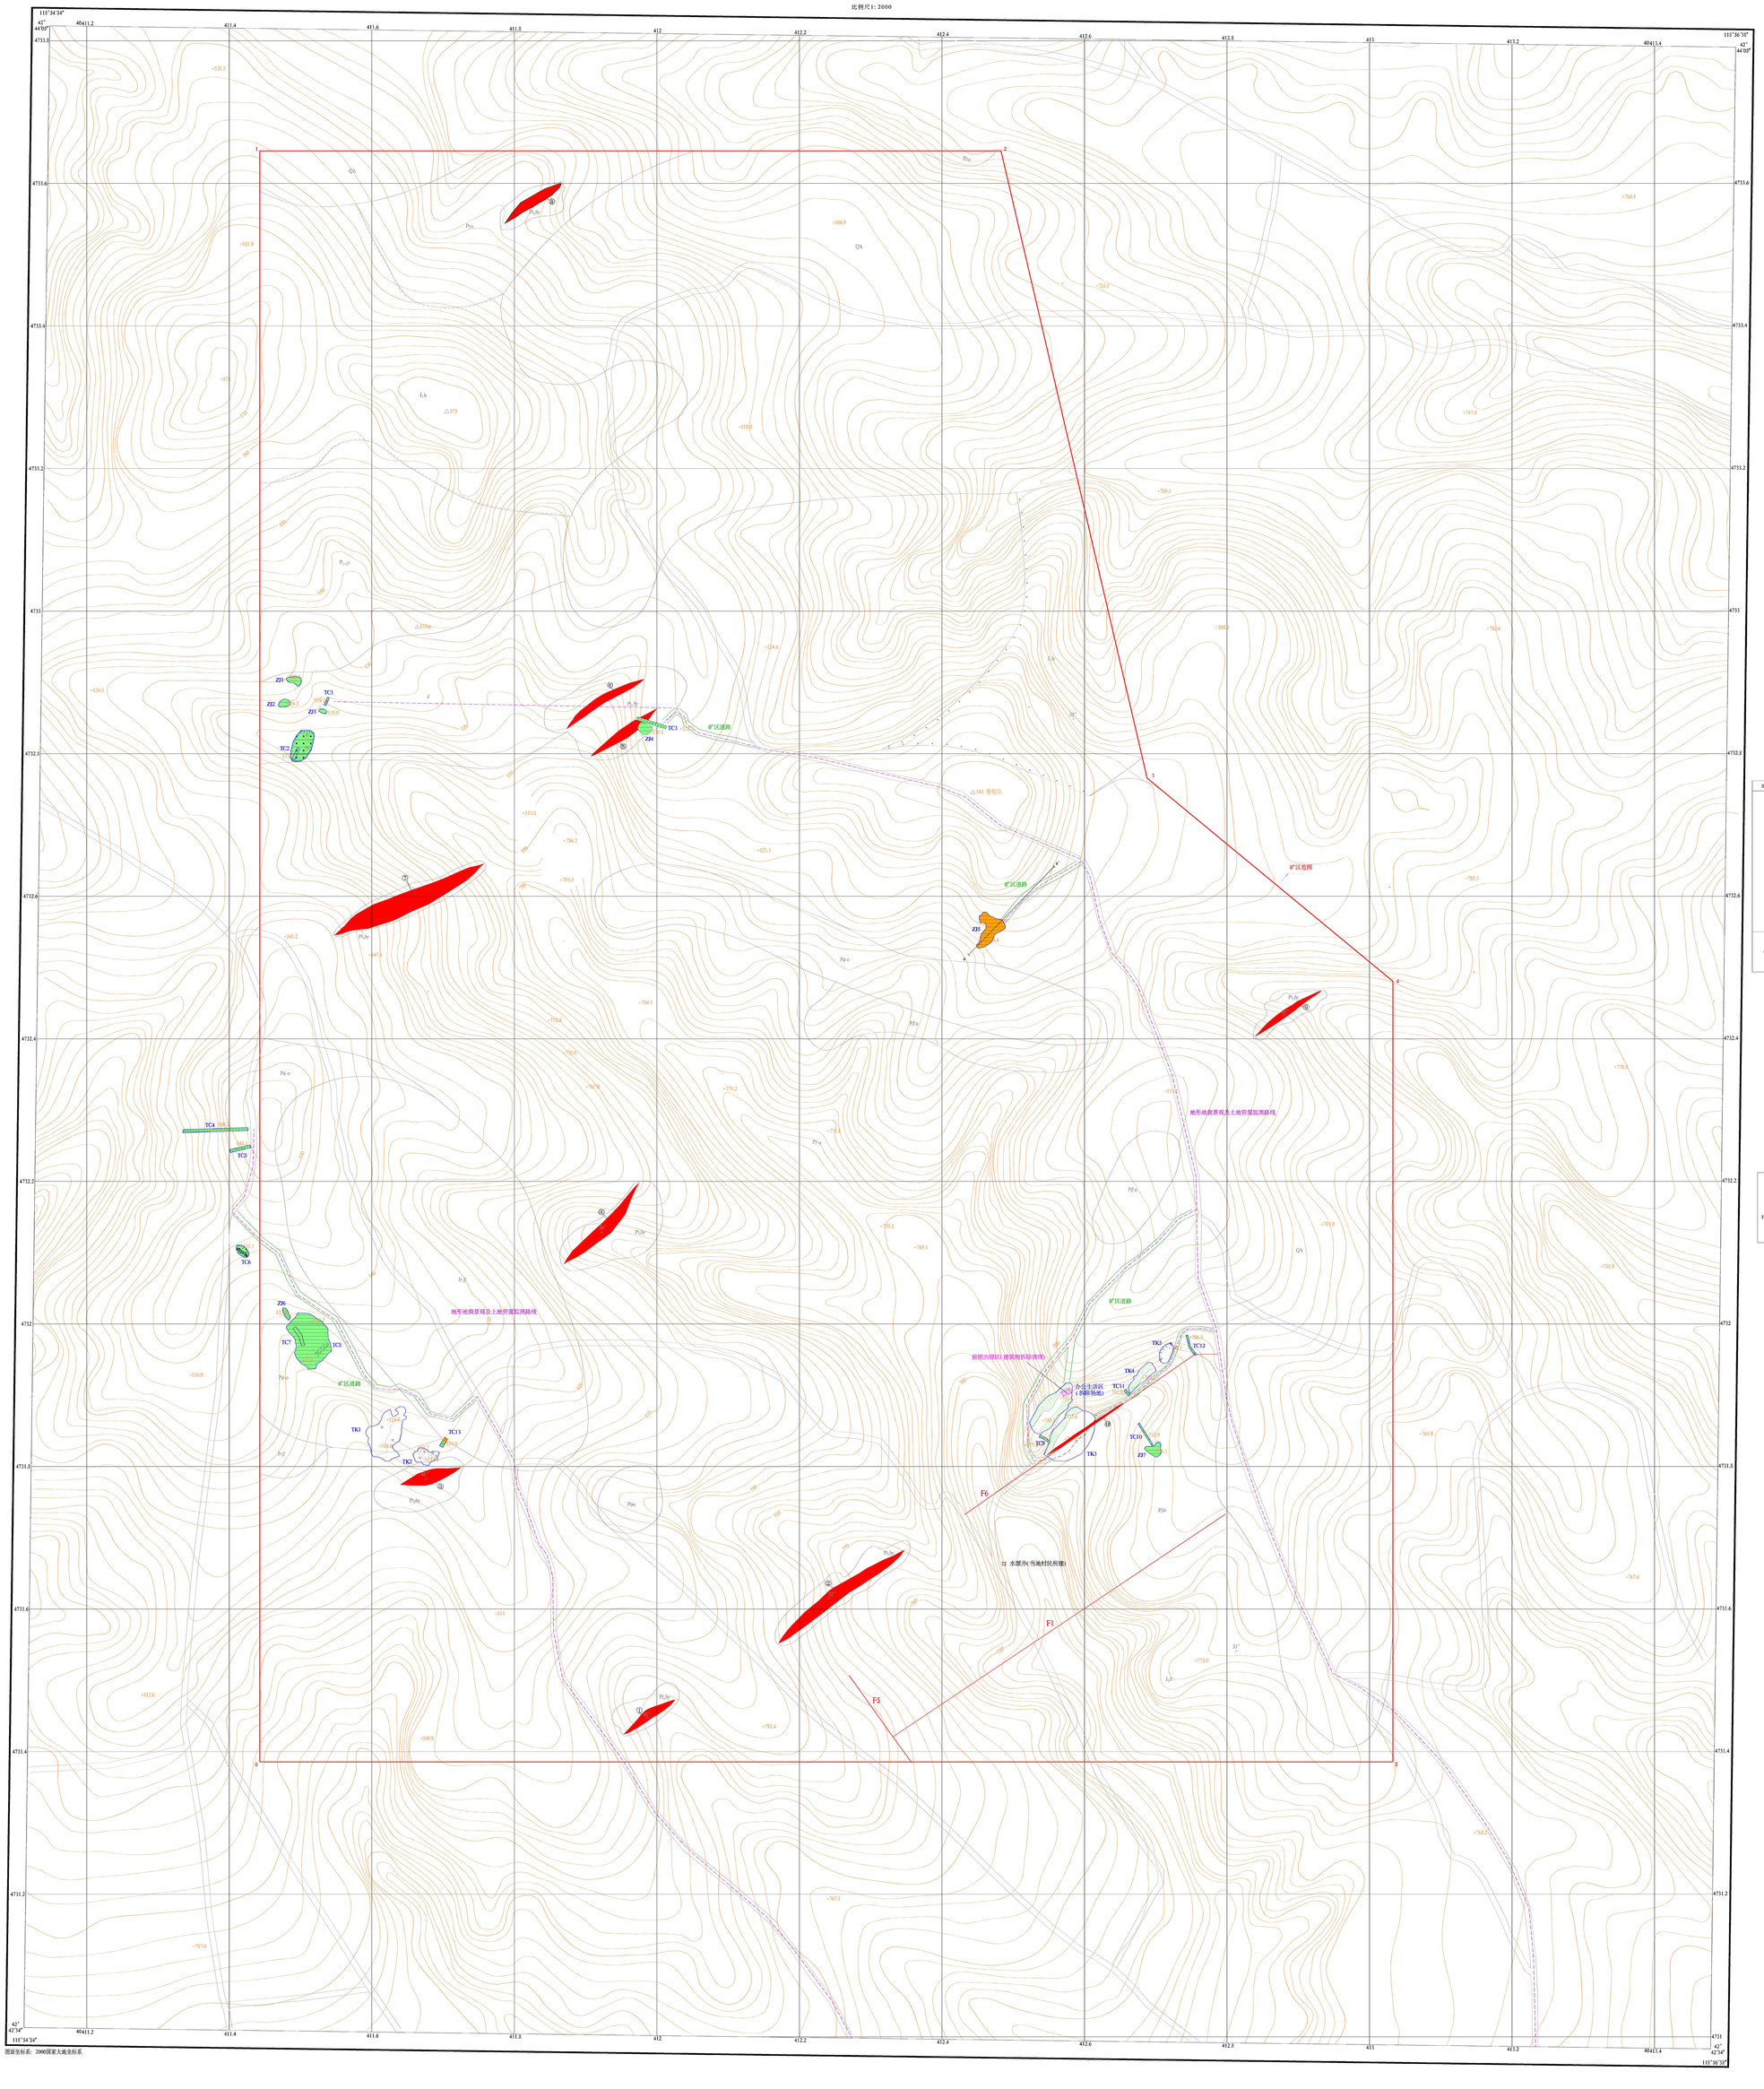

图例坐标系：2000国家大地坐标系

图 例

一、本年度治理及复垦责任区

- 回填
- 整平
- 种草
- 恢复草地
- 前期治理区

二、监测范围

- 地形地貌景观及土地资源监测路线

三、地层岩性及岩浆岩

- Qh 第四系全新统：坡洪积砂砾碎石及亚砂土
- J3b 侏罗系白音高老组：流纹质凝灰岩
- Pt1-2P 二叠系于家北沟组：变质细砂岩
- Pt1-2y 宝音图群：角闪斜长片麻岩夹磁铁石英岩
- J3β 侏罗纪黑云母花岗岩
- Pγo 二叠纪新长花岗岩
- Pβo 二叠纪辉绿玢岩
- Pνo 二叠纪角闪石岩
- 闪长岩脉

四、其它

- 实测地质界线
- 实测角度不整合界线
- 铁矿体位置及编号
- 探槽位置及编号
- 钻机平台位置及编号
- 探坑位置及编号
- 占用土地界限
- 矿区道路
- 矿区范围及拐点编号
- 治理效果剖面图

本年度矿山地质环境治理及土地复垦说明表

治理区名称	面积(m²)	矿山土地损毒现状和预测	治理措施
探槽(TC1~TC13)	6122	破坏地形地貌，挖损占用土地资源	对探槽进行回填、整平、种草
钻机平台(ZJ1~ZJ7)	2040	破坏地形地貌，挖损占用土地资源	对钻机平台场地进行整平、种草
合 计	8162		

矿山地质环境治理及土地复垦年度实施计划安排表

年度	治理区域	主要工程技术措施	治理工程量	治理费用（万元）
2026	1、探槽(TC1~TC13) 2、钻机平台(ZJ1~ZJ7)	1、对探槽进行回填、整平、种草； 2、对钻机平台场地进行整平、种草； 3、对复垦进行管护，对地形地貌景观及土地资源进行监测。	1、回填1326m³，整平2412m²，种草2040m²，恢复草地1.1ha²，恢复人工投草地0.3ha²； 2、对地形地貌景观及土地资源监测10次，根据管护年限，3次。	1.41
合计				1.41

本年度治理及土地复垦范围主要拐点坐标表

（2000国家坐标系）

治理区名称	面积(m²)	拐点编号	X	Y	拐点编号	X	Y
探槽	6122	TC1-1	4732870.14	40411339.16	TC1-2	4732867.69	40411354.38
		TC2-1	4732865.31	40411487.11	TC2-2	4732864.19	40411507.18
		TC2-2	4732791.30	40411489.79	TC2-4	4732825.79	40411508.71
		TC3-1	4732630.61	40411971.39	TC3-2	4732156.22	40412013.73
		TC4-1	4732273.03	40411426.01	TC4-2	4732270.65	40411134.37
		TC5-1	4732240.31	40411429.60	TC5-2	4732242.64	40411403.08
		TC6-1	4732058.40	40411404.09	TC6-2	4732056.14	40411431.68
		TC7-1	4731950.20	40411490.03	TC7-2	4731969.49	40411501.54
		TC8-1	4731972.92	40411537.50	TC8-2	4731956.75	40411521.39
		TC9-1	4731642.74	40412037.01	TC9-2	4731156.07	40412045.97
		TC10-1	4731060.09	40412670.50	TC10-2	4731029.07	40412693.92
		TC11-1	4731007.07	40412606.63	TC11-2	4731000.13	40412602.34
		TC12-1	4731006.16	40412656.70	TC12-1	4731000.41	40412663.14
		TC13-1	4731954.31	40412744.11	TC13-1	4731956.91	40412756.01
钻机平台	2040	ZJ1	4732904.32	40411492.11	ZJ3	4732107.59	40412472.21
		ZJ2	4732870.54	40411477.77	ZJ6	4732013.69	40411479.22
		ZJ4	4732038.93	40411532.11	ZJ7	4731022.41	40412695.69
		ZJ5	4732318.34	40411953.41			

前期已完成的矿山地质环境治理与土地复垦情况说明表

名称	前期已完成治理单元	完成治理面积(m²)	复垦地类	验收情况	还地情况
矿山地质环境治理方案	办公生活区	80	灰复地	未进行实地核查	未还区



钻机平台(ZJ3)整平、恢复种植(草地)效果图

赤峰盛京矿业有限公司			
赤峰盛京矿业有限公司翁牛特旗梧桐花镇敖包吐矿区铜铁矿 2026年度矿山地质环境治理工程部署图			
拟 编	张振广	图 号	1
审 核	李夏显	顺 序 号	1
曲线翻图	张振广	比 例 尺	1:2000
总工程师	张振广	日 期	2026.3
法人代表	李泽超	资料来源	收 集
